



Progetto

Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby
di Via San Grato - CUP J71B21001560005
Rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1



n.Tavola/Documento

Titolo Tavola/Documento

DE.P.G.01

PLANIMETRIA DI CANTIERE

Data:
APRILE 2023
REVISIONE 01 - A

Scala:

VARIE

File:

	Note:
--	--------------

REVISIONE 01 - APRILE 2023

Firme

R.U.P.

Geom. Mirella Scalise
Comune di Volpiano (TO) - Piazza Vittorio Emanuele II, n.12

Committente:

Comune di Volpiano (TO)
Piazza Vittorio Emanuele II, n.12 - 10088 Volpiano (TO)


Progettista:

Arch. Stefano Longhi
Corso Orbassano 191/7 - 10137 Torino (TO)

N.B.



L'impresa appaltatrice potrà individuare anche ambiti diversi per depositi e per baraccature di cantiere previa comunicazione preventiva alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza.

In merito ai WC chimici, i costi non saranno riconosciuti nel caso di convenzioni tra le parti.

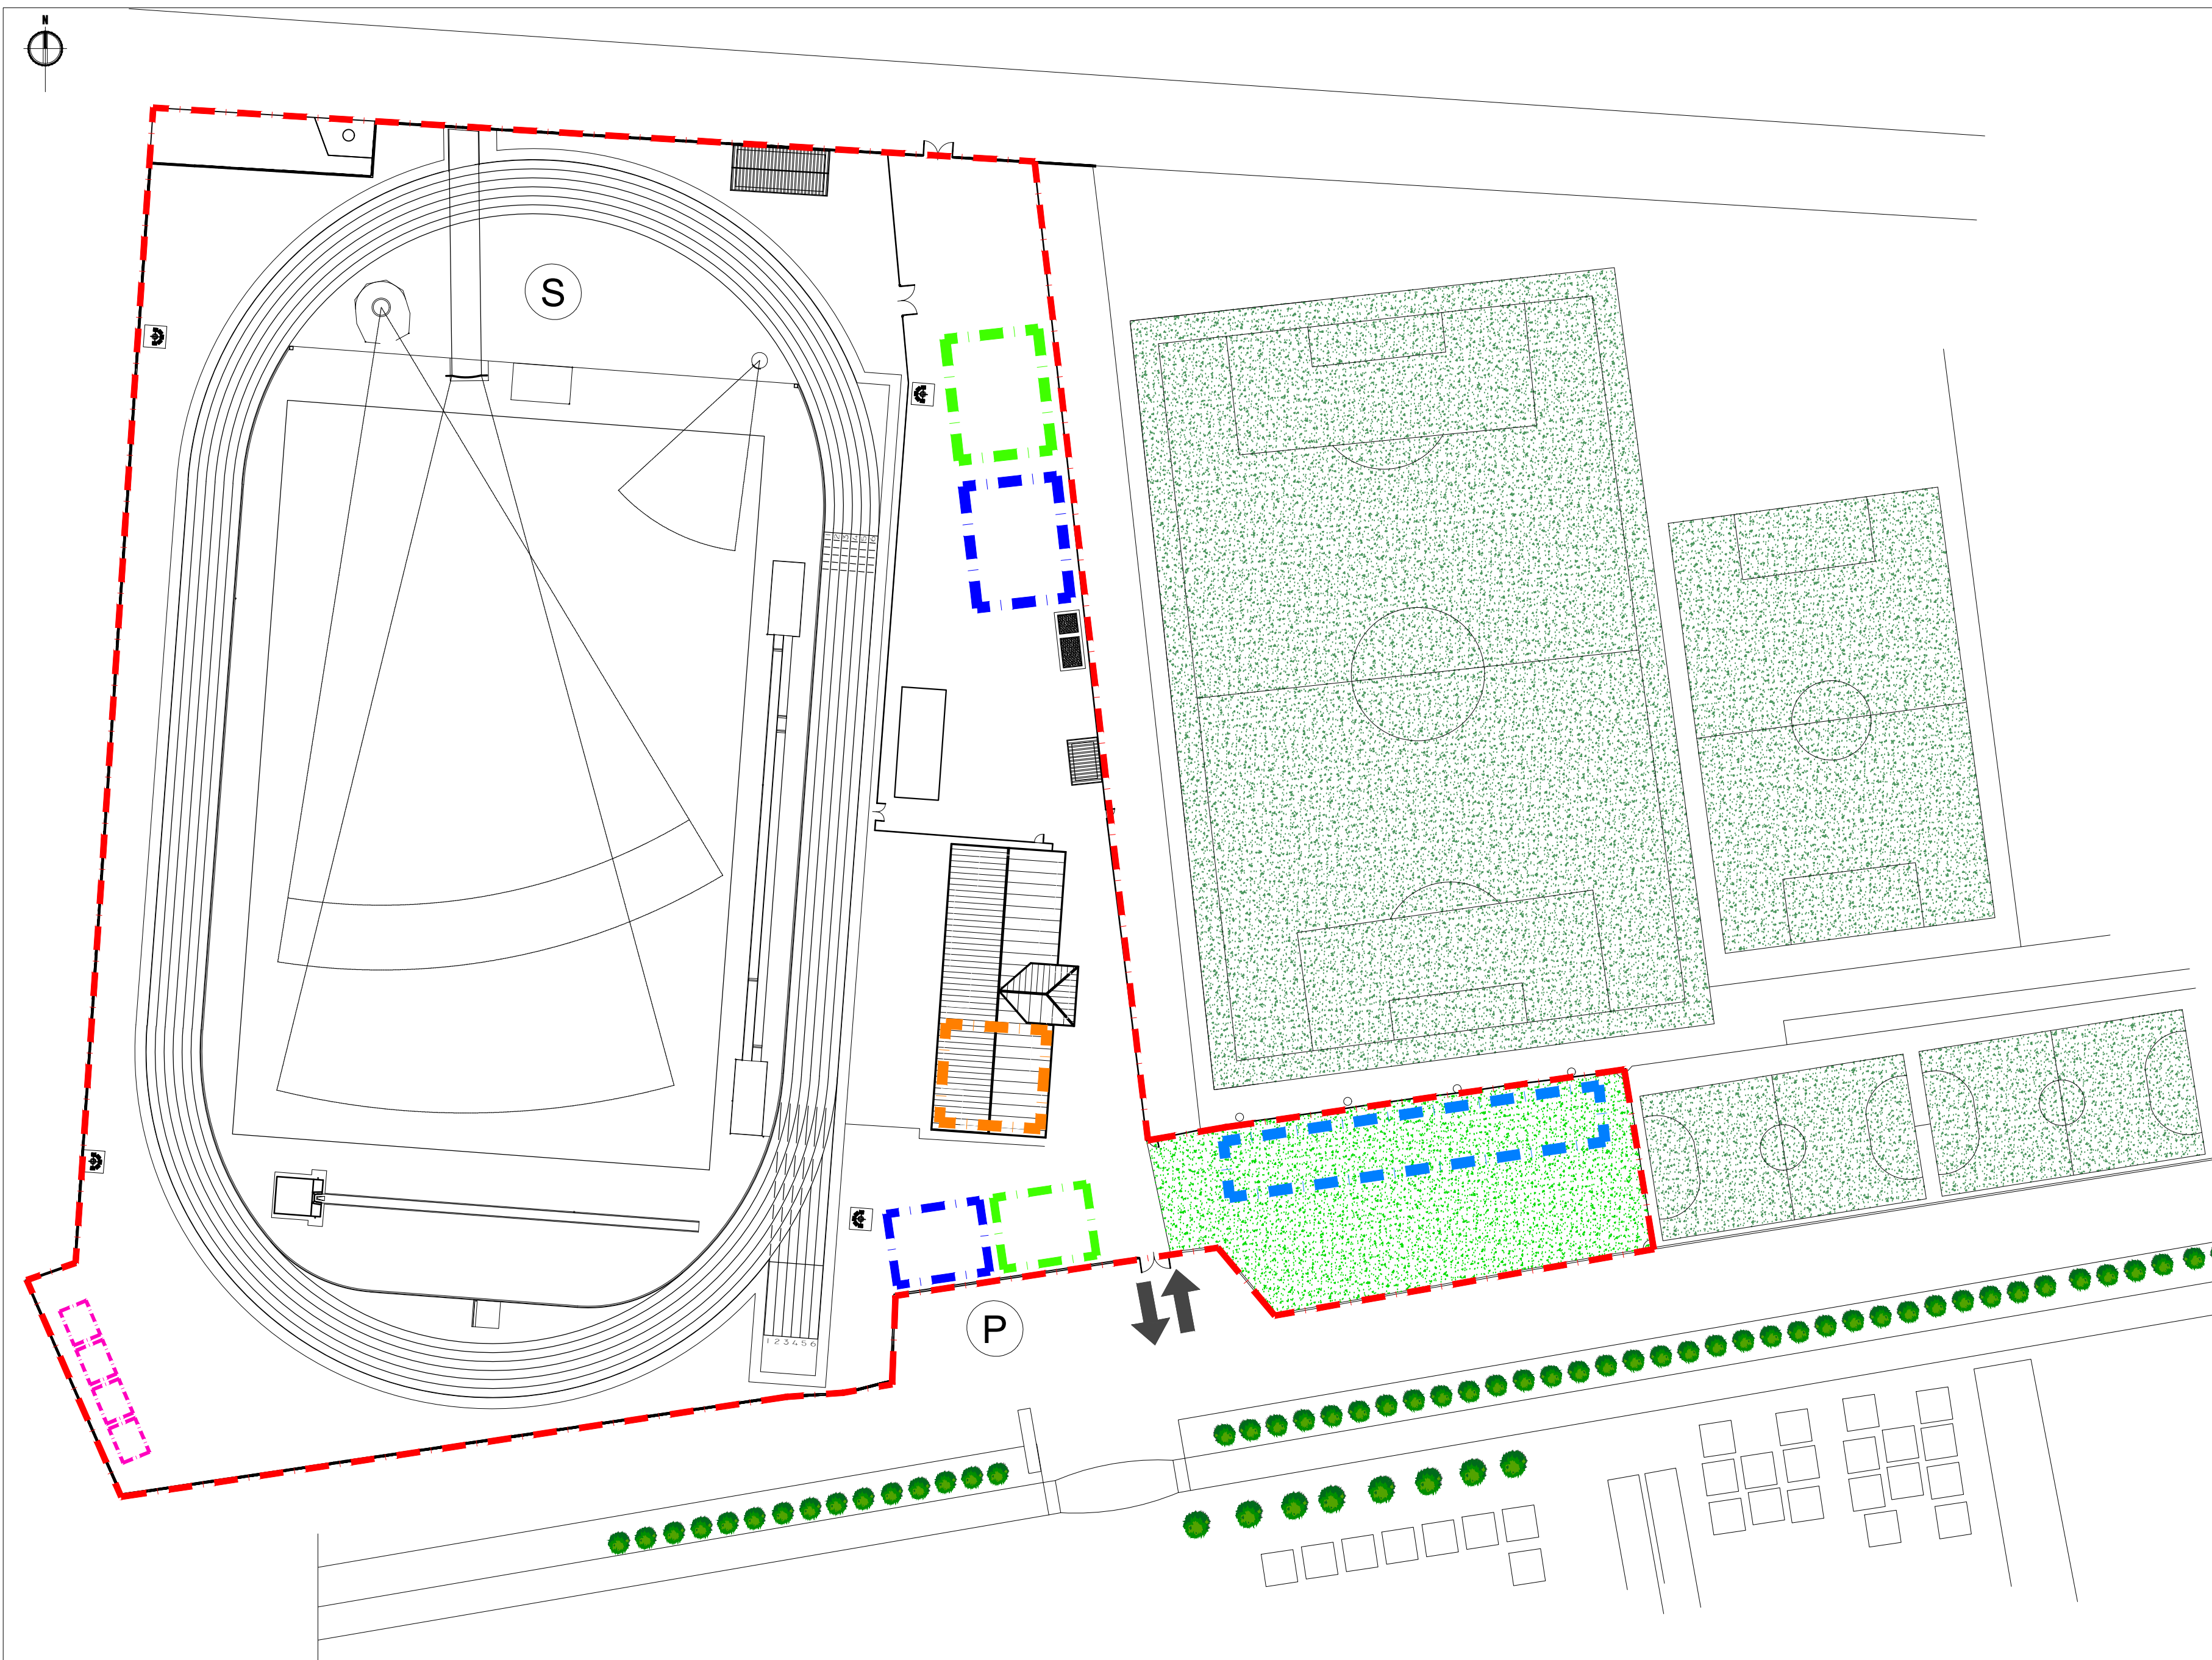

PLANIMETRIA DI CANTIERE

LEGENDA



COMUNE DI		PROVINCIA DI
LAVORI DI CONCESSIONE IN PROPRIETARIO DEL PROGETTAZIONE CORRISPONDENTE DIRETTORE DEI LAVORI CAPIRELLA CANTIERE ASSISTENTE TECNICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA COORDINATORE ANTICIPA PROGETTAZIONE COORDINATORE DEI LAVORI CALCOLAZIONE TRATTO COLLAUDAZIONE IN CORSO D'OPERA IMPRESA DI COSTRUZIONE SOMMARIAMENTE: IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO IDRAULICO IMPIANTO D'ALIMENTAZIONE AEREA N° PREVEDI DI CANTIERI DA REALIZZARE N° CANTIERE N° PIAZZE LAVORO N° FINE LAVORI		
		
		



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per dare corso alle lavorazioni è prevista l'individuazione dell'area di intervento, della viabilità interna, della viabilità esterna e di accesso al cantiere. Ancor prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovrà essere organizzata l'area di cantiere. In particolare dovrà essere prescelta l'ubicazione del baraccamento. Verrà individuato il punto più idoneo per l'infissione delle paline dell'impianto di terra, verranno installati la linea elettrica ed il quadro elettrico di cantiere, quella per l'illuminazione notturna e gli impianti idrico sanitari. Dovrà essere garantito, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a piè d'opera. Dette zone di lavorazione dovranno essere protette da tettoie se l'area ove sono ubicate verrà spazzata dal movimento di apparecchi di sollevamento e per la protezione dagli agenti atmosferici. L'impresa appaltatrice dovrà prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovrà altresì esaminare l'effettiva stabilità e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno o asfalto, per evitare affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto, carico e scarico. Oltre all'area di stoccaggio ed all'area per lavorazioni e preparazioni dei materiali da impiegare, dovrà essere individuata l'area per la raccolta dei materiali di risulta da avviare a discarica.
