COMUNE DI VOLPIANO (TO)

Progetto	Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di Via San Grato - CUP J71B21001560005 **Rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1** Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
n.Tavola/Documento DE.P.R.05	Titolo Tavola/Documento DIAGRAMMA DI GANTT

Data:	Scala:	File:	Note:
APRILE 2023		DEPR05	
REVISIONE 01 - APRILE 2023			

Firme

R.U.P.	Geom. Mirella Scalise Comune di Volpiano (TO) - Piazza Vittorio Emanuele II, n.12	
Committente:	Comune di Volpiano (TO) Piazza Vittorio Emanuele II, n.12 - 10088 Volpiano (TO)	
Progettista:	Arch. Stefano Longhi Corso Orbassano 191/7 - 10137 Torino (TO)	

stefanolonghi esercizi di architettura
STUDIO DI ARCHITETTURA LONGHI
C.so Orbassano 191/7 - Torino
Tel. 0113828959 Fax 0113828959
www.stefanolonghi.it
e-mail: info@archistudiolonghi.com
stefano@stefanolonghi.it

A termine di Legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi senza la preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto dalla L.241/90 e s.m.i. art.. 22-23-24-25

ALLEGATO "A"

Comune di VOLPIANO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di Via San Grato - Rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1
COMMITTENTE: COMUNE DI VOLPIANO.

CANTIERE: Via San Grato, VOLPIANO (TO)

, 26/04/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Architetto LONGHI Stefano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(RUP Geom. Scalise Mirella)

Architetto LONGHI Stefano
Corso Orbassano n.191/7
10137 Torino (TO)
Tel.: 011.3828959 - Fax: 011.3828959
E-Mail: info@archistudiolonghi.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
Allestimento del cantiere		
Realizzazione della viabilità del cantiere	3	3
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	3	3
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	5	5
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere	5	5
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	5
Campo da rugby in erba naturale		
Demolizioni o rimozioni varie (panchine, aree tecniche, porte, sistema di irrigazione e drenaggio)	5	5
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	14	14
Scavo di sbancamento	14	14
Scavo per nuovi pozzi di ispezione	10	10
Rinterro di scavo eseguito a macchina	8	8
Posa di speco fognario e rete di drenaggio (compresi i pozzi disperdenti)	16	16
Messa in opera di pozzetti di ispezione	12	12
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	12	12
Realizzazione della rete di irrigazione	18	18
Realizzazione campo in erba naturale	27	27
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (basamenti panchine, piattaforma)	6	6
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (basamenti panchine, piattaforma, plinti porte)	6	6
Posa delle attrezzature	6	6
Campo da rugby under 9 in erba sintetica		
Torri faro		
Rimozione di apparecchi illuminanti su torre faro	12	12
Installazione di corpi illuminanti	12	12
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	12	12
Campo		
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	12	12
Scavo di sbancamento	12	12
Scavo per nuovi pozzi di ispezione	7	7
Rinterro di scavo eseguito a macchina	7	7
Posa di speco fognario e rete di drenaggio (compreso il pozzo disperdente)	10	10
Messa in opera di pozzetti di ispezione	8	8
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	7	7
Realizzazione della rete di irrigazione	14	14
Realizzazione campo in erba artificiale	22	22
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (basamenti panchine)	5	5
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (basamenti panchine)	5	5
Posa delle attrezzature	5	5
Area esterna		
Formazione di sottofondo in tessuto non tessuto e misto granulare	9	9
Cordoli	7	7
Posa di pavimenti per esterni in masselli	7	7
Lavori di finitura e imprevisti		

Modifiche in corso d'opera e imprevisti	13	13
Pulizia generale dell'area di cantiere	5	5
Smobilizzo del cantiere	6	6

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
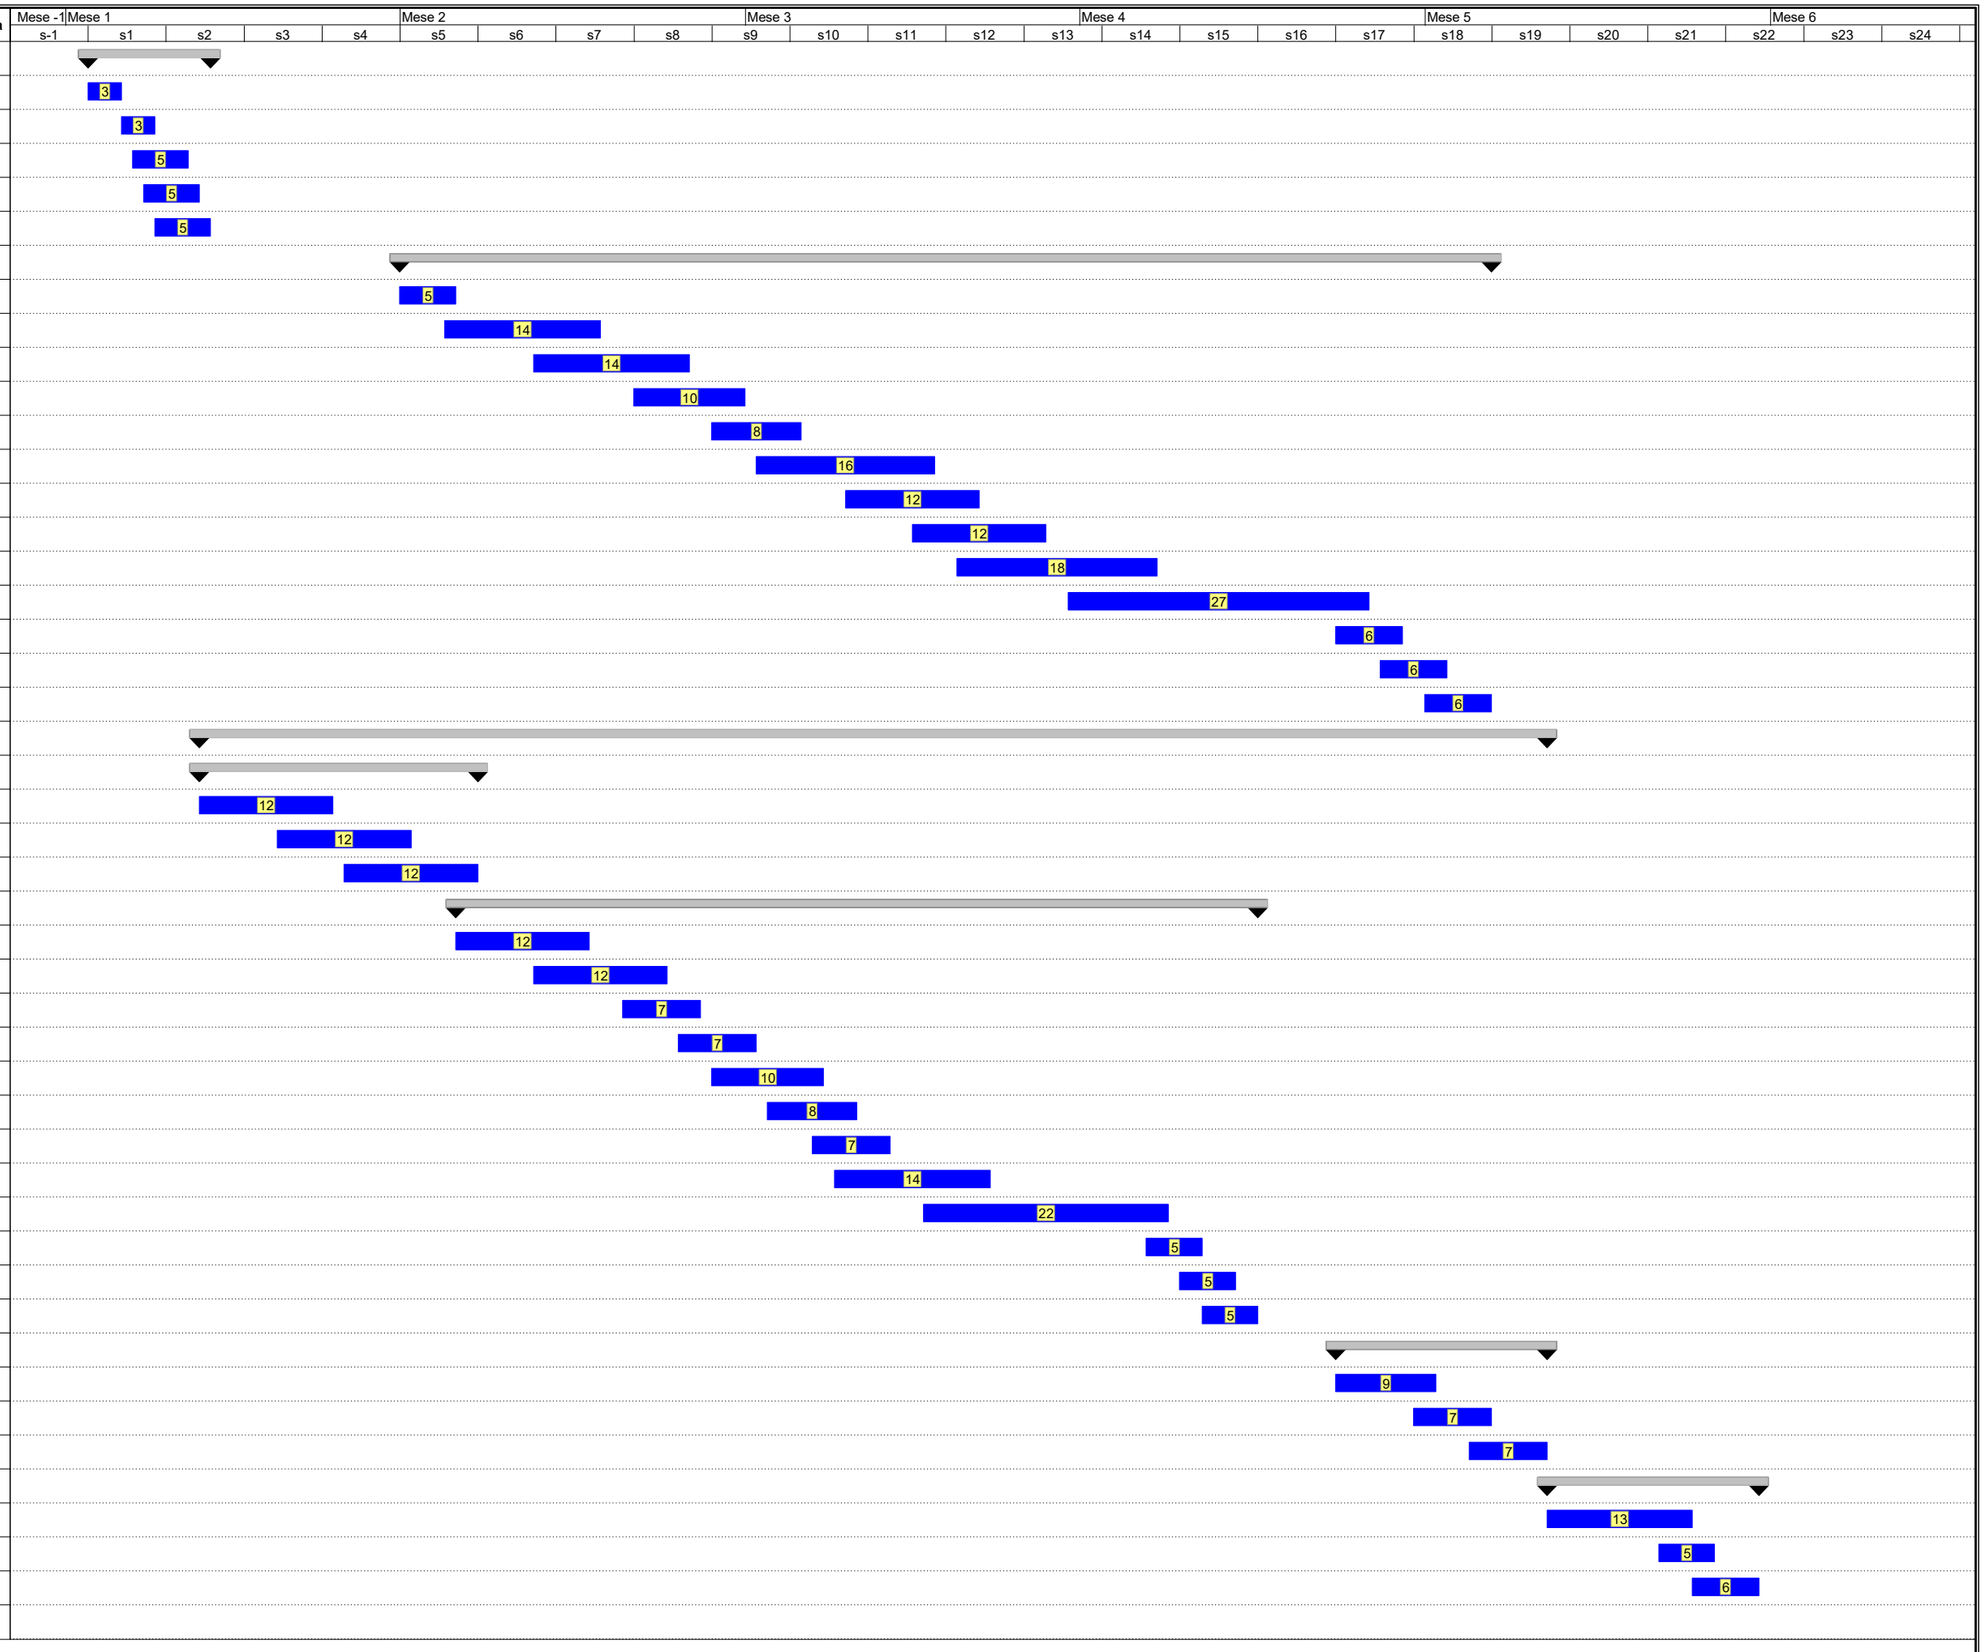
Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	11 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere	3 g
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari	5 g
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere	5 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g
Campo da rugby in erba naturale	98 g
Demolizioni o rimozioni varie (panchine, aree tecniche, porte, s	5 g
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	14 g
Scavo di sbancamento	14 g
Scavo per nuovi pozzi di ispezione	10 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	8 g
Posa di speco fognario e rete di drenaggio (compresi i pozzi di	16 g
Messa in opera di pozzetti di ispezione	12 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	12 g
Realizzazione della rete di irrigazione	18 g
Realizzazione campo in erba naturale	27 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (I	6 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (basamenti pan	6 g
Posa delle attrezzature	6 g
Campo da rugby under 9 in erba sintetica	121 g
Torri faro	25 g
Rimozione di apparecchi illuminanti su torre faro	12 g
Installazione di corpi illuminanti	12 g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficien	12 g
Campo	72 g
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	12 g
Scavo di sbancamento	12 g
Scavo per nuovi pozzi di ispezione	7 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	7 g
Posa di speco fognario e rete di drenaggio (compreso il p	10 g
Messa in opera di pozzetti di ispezione	8 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	7 g
Realizzazione della rete di irrigazione	14 g
Realizzazione campo in erba artificiale	22 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt	5 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (basamen	5 g
Posa delle attrezzature	5 g
Area esterna	19 g
Formazione di sottofondo in tessuto non tessuto e misto	9 g
Cordoli	7 g
Posa di pavimenti per esterni in masselli	7 g
Lavori di finitura e imprevisti	19 g
Modifiche in corso d'opera e imprevisti	13 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	5 g
Smobilizzo del cantiere	6 g
