COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Lavori:	**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**
	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO / SUB INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"
	Realizzazione struttura di copertura aree sportive presso la Scuola G. Ghirotti
CUP:	J73B18000710004
Località:	VOLPIANO (To)
Via:	Carlo Alberto dalla Chiesa
Proprietà:	Amministrazione Comunale
Committente:	arch. Monica VERONESE, in qualità di RUP
Progettista:	ing. Finazzi Marco
Livello:	DEFINITIVO/ ESECUTIVO
Revisione:	02
Data di emissione:	27.04.2023

12.0 CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI

Il RUP,
arch. VERONESE Monica

Il progettista,
ing. FINAZZI Marco

documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

0. Nota alla revisione

1. premessa

2. cronoprogramma in forma grafica (GANTT)

0.
NOTA ALLA REVISIONE

01	12.04.2023	Prima emissione per verifica con UTC
02	27.04.2023	Seconda emissione a seguito istruttoria UTC
03		
04		

1.
PREMESSA

Le tempistiche di esecuzione dei lavori sono stimate in riferimento all'incidenza della manodopera sulla singola macrovoce, alla squadra tipica impiegata in questo tipo di realizzazione (4/5 elementi) ed al costo medio giornaliero della squadra, tenendo altresì conto delle peculiari condizioni in cui le lavorazioni si debbono svolgere.

I periodi sono espressi in ***giorni naturali e consecutivi*** tenendo conto di condizioni meteorologiche ragionevolmente prevedibili per il periodo di esecuzione del cantiere (estate/autunno 2023) e per la località (periferia di Torino), pertanto l'appaltatore dovrà organizzare per tempo le forniture, la logistica di cantiere e l'avvicendamento del personale al fine di rispettare la programmazione proposta.

2.
GANTT

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**PNRR: copertura piastra sportiva scuola Ghirotti**	**68 g**	**lun 04/09/23**	**ven 10/11/23**
2	**INIZIO LAVORI**	0 g	lun 04/09/23	lun 04/09/23
3	ordinativi	45 g	lun 04/09/23	mer 18/10/23
4	Accantieramento e apprestamenti di sicurezza	2 g	mar 05/09/23	mer 06/09/23
5	**Opere preparatorie**	**25 g**	**gio 07/09/23**	**dom 01/10/23**
6	taglio pavimento e scavo in sezione	2 g	gio 07/09/23	ven 08/09/23
7	bonifica fondazioni perimetrali	1 g	sab 09/09/23	sab 09/09/23
8	armatura cordoli	4 g	dom 10/09/23	mer 13/09/23
9	getto cordoli	1 g	ven 15/09/23	ven 15/09/23
10	maturazione cordolo in c.a.	16 g	sab 16/09/23	dom 01/10/23
11	**Montaggio copertura sportiva**	**26 g**	**lun 02/10/23**	**ven 27/10/23**
12	montaggio piastre al piede	2 g	lun 02/10/23	mar 03/10/23
13	assemblaggio portali a terra	3 g	gio 19/10/23	sab 21/10/23
14	sollevamento archi e montaggio controventi	1 g	dom 22/10/23	dom 22/10/23
15	installazione copertura in lamiera	2 g	lun 23/10/23	mar 24/10/23
16	installzione linea vita	1 g	mer 25/10/23	mer 25/10/23
17	completamento lattonerie e accessori	2 g	gio 26/10/23	ven 27/10/23
18	**impianti**	**51 g**	**gio 14/09/23**	**ven 03/11/23**
19	messa a terra	1 g	gio 14/09/23	gio 14/09/23
20	impianto elettrico FM, ILL e EM	5 g	mer 25/10/23	dom 29/10/23
21	quadro e allaccio	5 g	lun 30/10/23	ven 03/11/23
22	**sistemazioni esterne**	**4 g**	**sab 04/11/23**	**mar 07/11/23**
23	sistemazione recinzioni	1 g	sab 04/11/23	sab 04/11/23
24	sistemazione area verde	1 g	dom 05/11/23	dom 05/11/23
25	pulizia e rimozione cantiere	2 g	lun 06/11/23	mar 07/11/23
26	**collaudi funzionali degli impianti e verifica complessiva**	3 g	mer 08/11/23	ven 10/11/23
27	**FINE LAVORI**	0 g	ven 10/11/23	ven 10/11/23

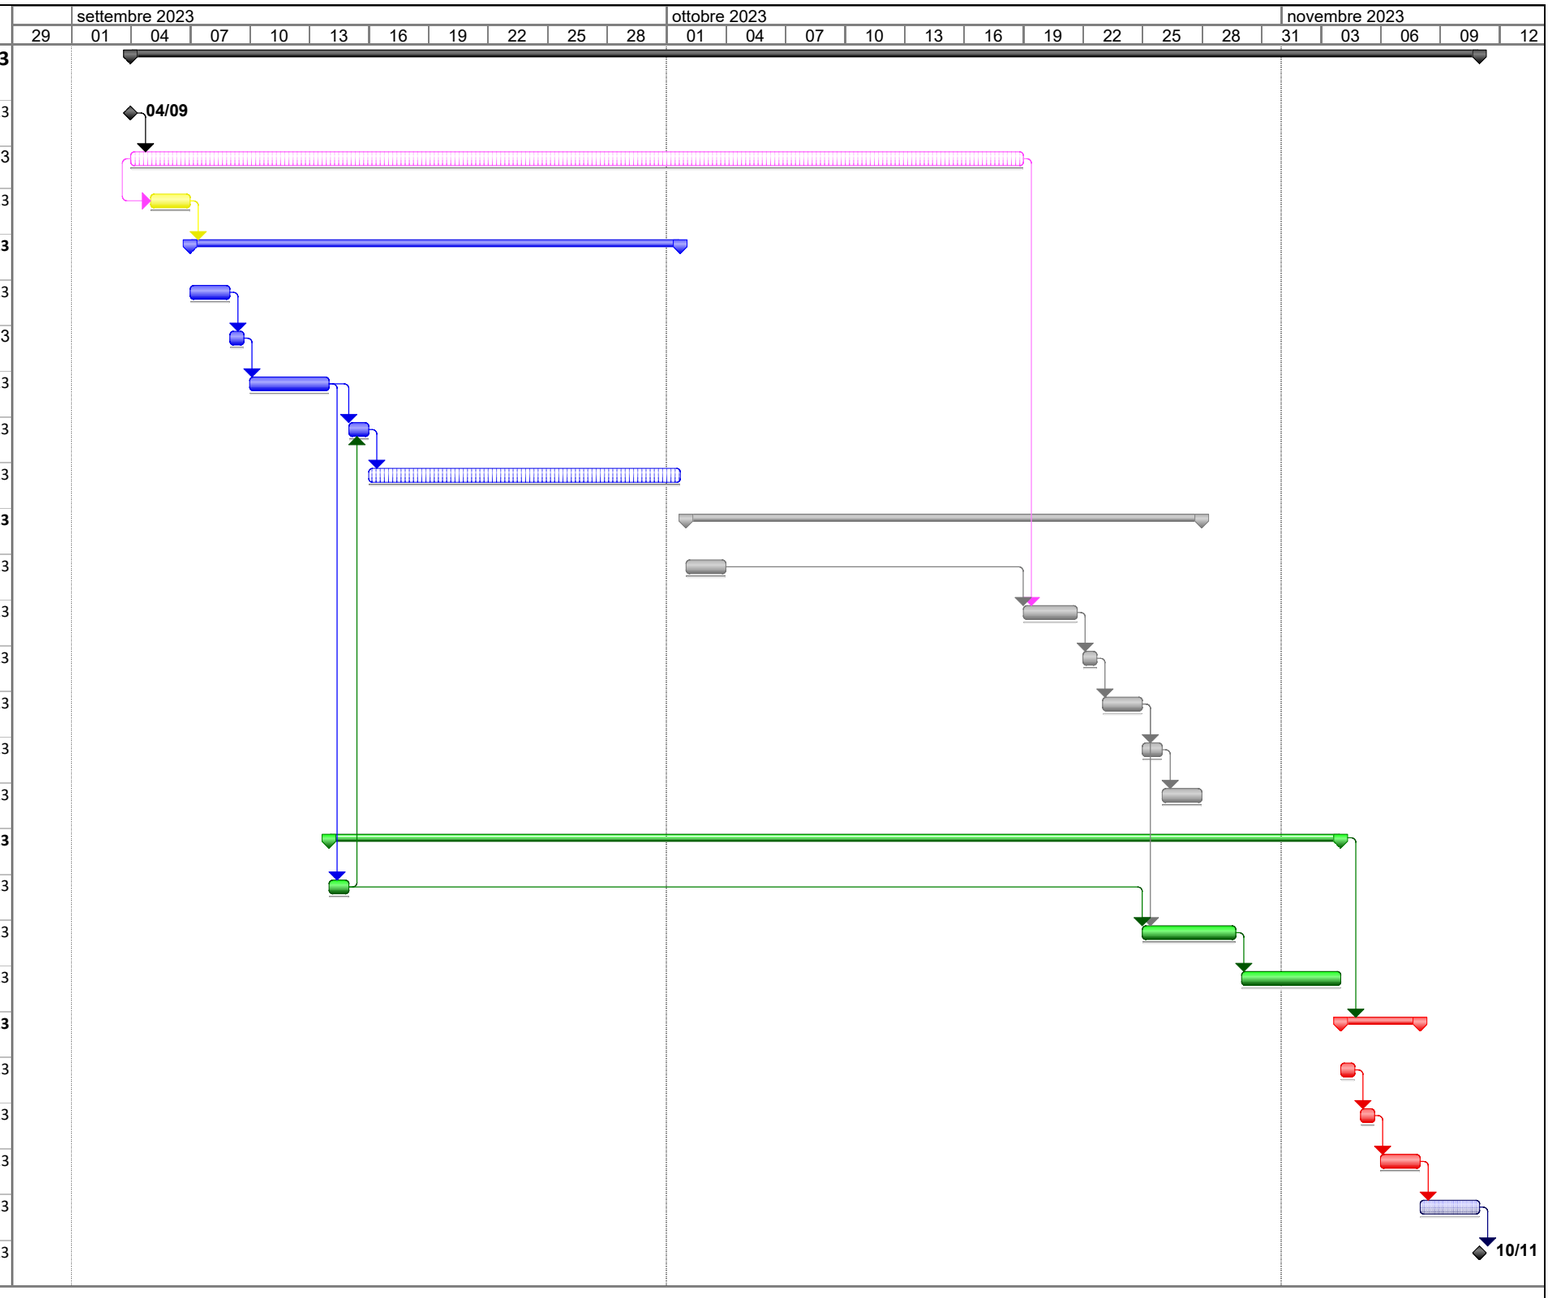

Volpiano__gantt
Data: ven 28/04/23

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno
